


Rahmenterminplan Errichtung Containerdorf in Ratzeburg

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2023			1. Qtl, 2024			2. Qtl, 2024			3. Qtl, 2024			4. Qtl, 2024			1. Qtl, 2025			2. Qtl, 2025		
					Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
1	Containerdorf Ratzeburg	267 Tage	Die 05.12.23	Don 19.12.24																					
2	Ausschreibung und Vergabe Planer	36 Tage	Die 05.12.23	Mit 31.01.24																					
3	Erstellung und Abstimmung Umsetzungskonzept, Klärung Anforderungen	10 Tage	Die 05.12.23	Mon 18.12.23																					
4	Erstellung Vergabeunterlagen Planung (Funktional)	15 Tage	Die 05.12.23	Die 02.01.24																					
5	Bieterphase Generalplanung (beschränkt)	15 Tage	Mit 03.01.24	Die 23.01.24																					
6	Angebotsauswertung und Vergabeempfehlung	1 Tag	Mit 24.01.24	Mit 24.01.24																					
7	Freigabe Vergabe Generalplaner durch Gremien	5 Tage	Don 25.01.24	Mit 31.01.24																					
8	Zuschlag Planer	0 Tage	Mit 31.01.24	Mit 31.01.24																					
9	Ausschreibung und Vergabe Betreiber	36 Tage	Die 19.03.24	Die 07.05.24																					
10	Erstellung Vergabeunterlagen Betrieb (Funktional)	15 Tage	Die 19.03.24	Mon 08.04.24																					
11	Bieterphase Betrieb (beschränkt)	15 Tage	Die 09.04.24	Mon 29.04.24																					
12	Angebotsauswertung und Vergabeempfehlung	1 Tag	Die 30.04.24	Die 30.04.24																					
13	Freigabe Vergabe Betrieb durch Gremien	5 Tage	Mit 01.05.24	Die 07.05.24																					
14	Zuschlag Betreiber	0 Tage	Die 07.05.24	Die 07.05.24																					
15	Planung und Ausführungsvorbereitung	131 Tage	Don 01.02.24	Don 01.08.24																					
16	Vor- und Entwurfsplanung (inkl. Fachplanungen)	26 Tage	Don 01.02.24	Don 07.03.24																					
17	Vorbereitung Freigabe Budget und Umsetzungskonzept durch Gremien	7 Tage	Fre 08.03.24	Mon 18.03.24																					
18	Beschluss Gremien für Umsetzungsbudget	0 Tage	Mon 18.03.24	Mon 18.03.24																					
19	Genehmigungsplanung inkl. Bauantrag	15 Tage	Fre 08.03.24	Don 28.03.24																					
20	Prüfung Bauantrag durch Genehmigungsbehörde	60 Tage	Die 19.03.24	Mon 10.06.24																					
21	Baugenehmigung liegt vor	0 Tage	Mon 10.06.24	Mon 10.06.24																					
22	Ausführungsplanung und Arbeitsvorbereitung	20 Tage	Fre 29.03.24	Don 25.04.24																					
23	Erstellung Vergabeunterlagen Bauleistungen	20 Tage	Fre 26.04.24	Don 23.05.24																					
24	Ausschreibungs- und Vergabephase Bauleistungen	40 Tage	Fre 24.05.24	Don 18.07.24																					
25	Freigabe Vergabe Bauleistungen durch Gremien	10 Tage	Fre 19.07.24	Don 01.08.24																					
26	Zuschlag Bauleistungen	0 Tage	Don 01.08.24	Don 01.08.24																					
27	Fördermittelmanagement	252 Tage	Mit 03.01.24	Don 19.12.24																					
28	Abstimmung Randbedingungen mit Fördermittelgeber	20 Tage	Mit 03.01.24	Die 30.01.24																					
29	Erstellung Vollantrag, inkl. Abgabe	7 Tage	Die 19.03.24	Mit 27.03.24																					
30	Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor	0 Tage	Mit 24.04.24	Mit 24.04.24																					
31	Prüfung Förderantrag	90 Tage	Don 28.03.24	Mit 31.07.24																					
32	Förderbescheid liegt vor	0 Tage	Mit 31.07.24	Mit 31.07.24																					
33	Erstellung Verwendungsnachweis und Endabrechnung	10 Tage	Fre 06.12.24	Don 19.12.24																					
34	Bauleistung	90 Tage	Fre 16.08.24	Don 19.12.24																					
35	Vorbereitende Arbeiten (Baugrund, Erdbau)	15 Tage	Fre 16.08.24	Don 05.09.24																					
36	Fundamente für Container	15 Tage	Fre 06.09.24	Don 26.09.24																					
37	Leitungsverlegung (alle Medien)	30 Tage	Fre 27.09.24	Don 07.11.24																					
38	Aufstellung Container	10 Tage	Fre 08.11.24	Don 21.11.24																					
39	Anschluss und Ausstattung Container	15 Tage	Fre 22.11.24	Don 12.12.24																					
40	Zaun, Spielplatz, Grillplatz etc.	10 Tage	Fre 29.11.24	Don 12.12.24																					
41	Abnahmen/Inbetriebnahmen/ Übergaben etc.	5 Tage	Fre 13.12.24	Don 19.12.24																					

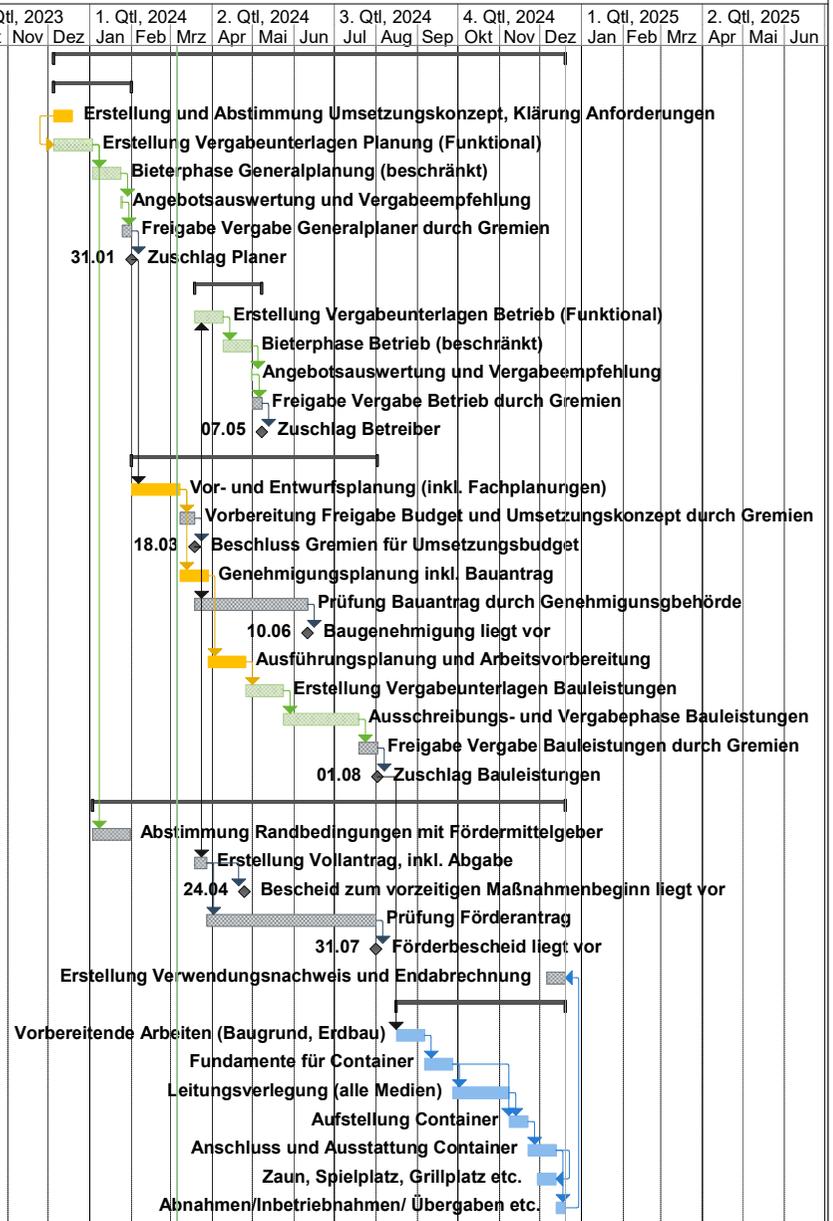

Projekt: Containerdorf Ratzeburg Bauleistungen A+V Meilenstein
 Datum: Mit 06.03.24 Planungsleistungen Sonstige Leistungen Sammelvorgang
